



Valutazione della variabilità del campo elettrico

Operatore: Automatico	Registratore: C-Pro Fiam			
Precisione: 16bit	Fondo scala: +/- 20 Volt	<i>dati per il calcolo:</i>		u.m.
Gestore rete:	Reti Distribuzione Ivrea			
Codice impianto distribuzione:	34687	intervallo campionamento	1	secondo
Codice univoco:	AF13	intervallo di salvataggio dati	60	secondi
Ubicazione:	Montalto Dora - Via Aosta Fs 2	limite minimo ddp:	0,85	Volt negativi
Tipo	A.RFI			
Data inizio misure	3 aprile 2020	<i>dati acquisiti:</i>		
Ora inizio misure	12.21			
Codice RTU	1151	numero di record salvati	4320	
min ddp al secondo	1,619	Volt negativi	periodo registrazione	259200 secondi
min ddp al minuto	1,694	Volt negativi	minuti registrazione	4320 minuti
max ddp al minuto	1,858	Volt negativi	ore registrazione	72 ore
max ddp al secondo	1,884	Volt negativi		
ddp medio	1,823	Volt negativi		
secondi non protetti in 24h:	0	secondi	totale minuti non protetti:	0 minuti

conformità della misura:

(secondo LG APCE - ed V - 22/06/2015)

CONFORME

parametri per il calcolo:

ddp sotto il 10% della media	0,00	% dei valori registrati	ddp medio / minuto - 25%	1,368	Volt negativi
ddp sopra il 10% della media	0,00	% dei valori registrati	ddp medio / minuto - 10%	1,641	Volt negativi
totale	0,00	% dei valori registrati	ddp medio	1,823	Volt negativi
ddp sotto il 25% della media	0,00	% dei valori registrati	ddp medio / minuto + 10%	2,006	Volt negativi
ddp sopra il 25% della media	0,00	% dei valori registrati	ddp medio / minuto + 25%	2,279	Volt negativi
totale	0,00	% dei valori registrati			

livello variabilità secondo UNI 10950:2001:

BASSO

campioni < media - 50 mV	1,90	% dei valori registrati
campioni > media + 50 mV	0,00	% dei valori registrati
campioni interferiti	1,90	% dei valori registrati

livello variabilità secondo UNI 11094:2019: **NON INTERFERITO**

Eseguito da: Fabio Serrami 22 aprile 2020




RETI DISTRIBUZIONE



RTU1151 - AF13 - Montalto Dora - Via Aosta Fs 2

ddp tubo Volt negativi, valori min/secondo, max/secondo, medio/minuto


dal 03/04/2020 al 06/04/2020

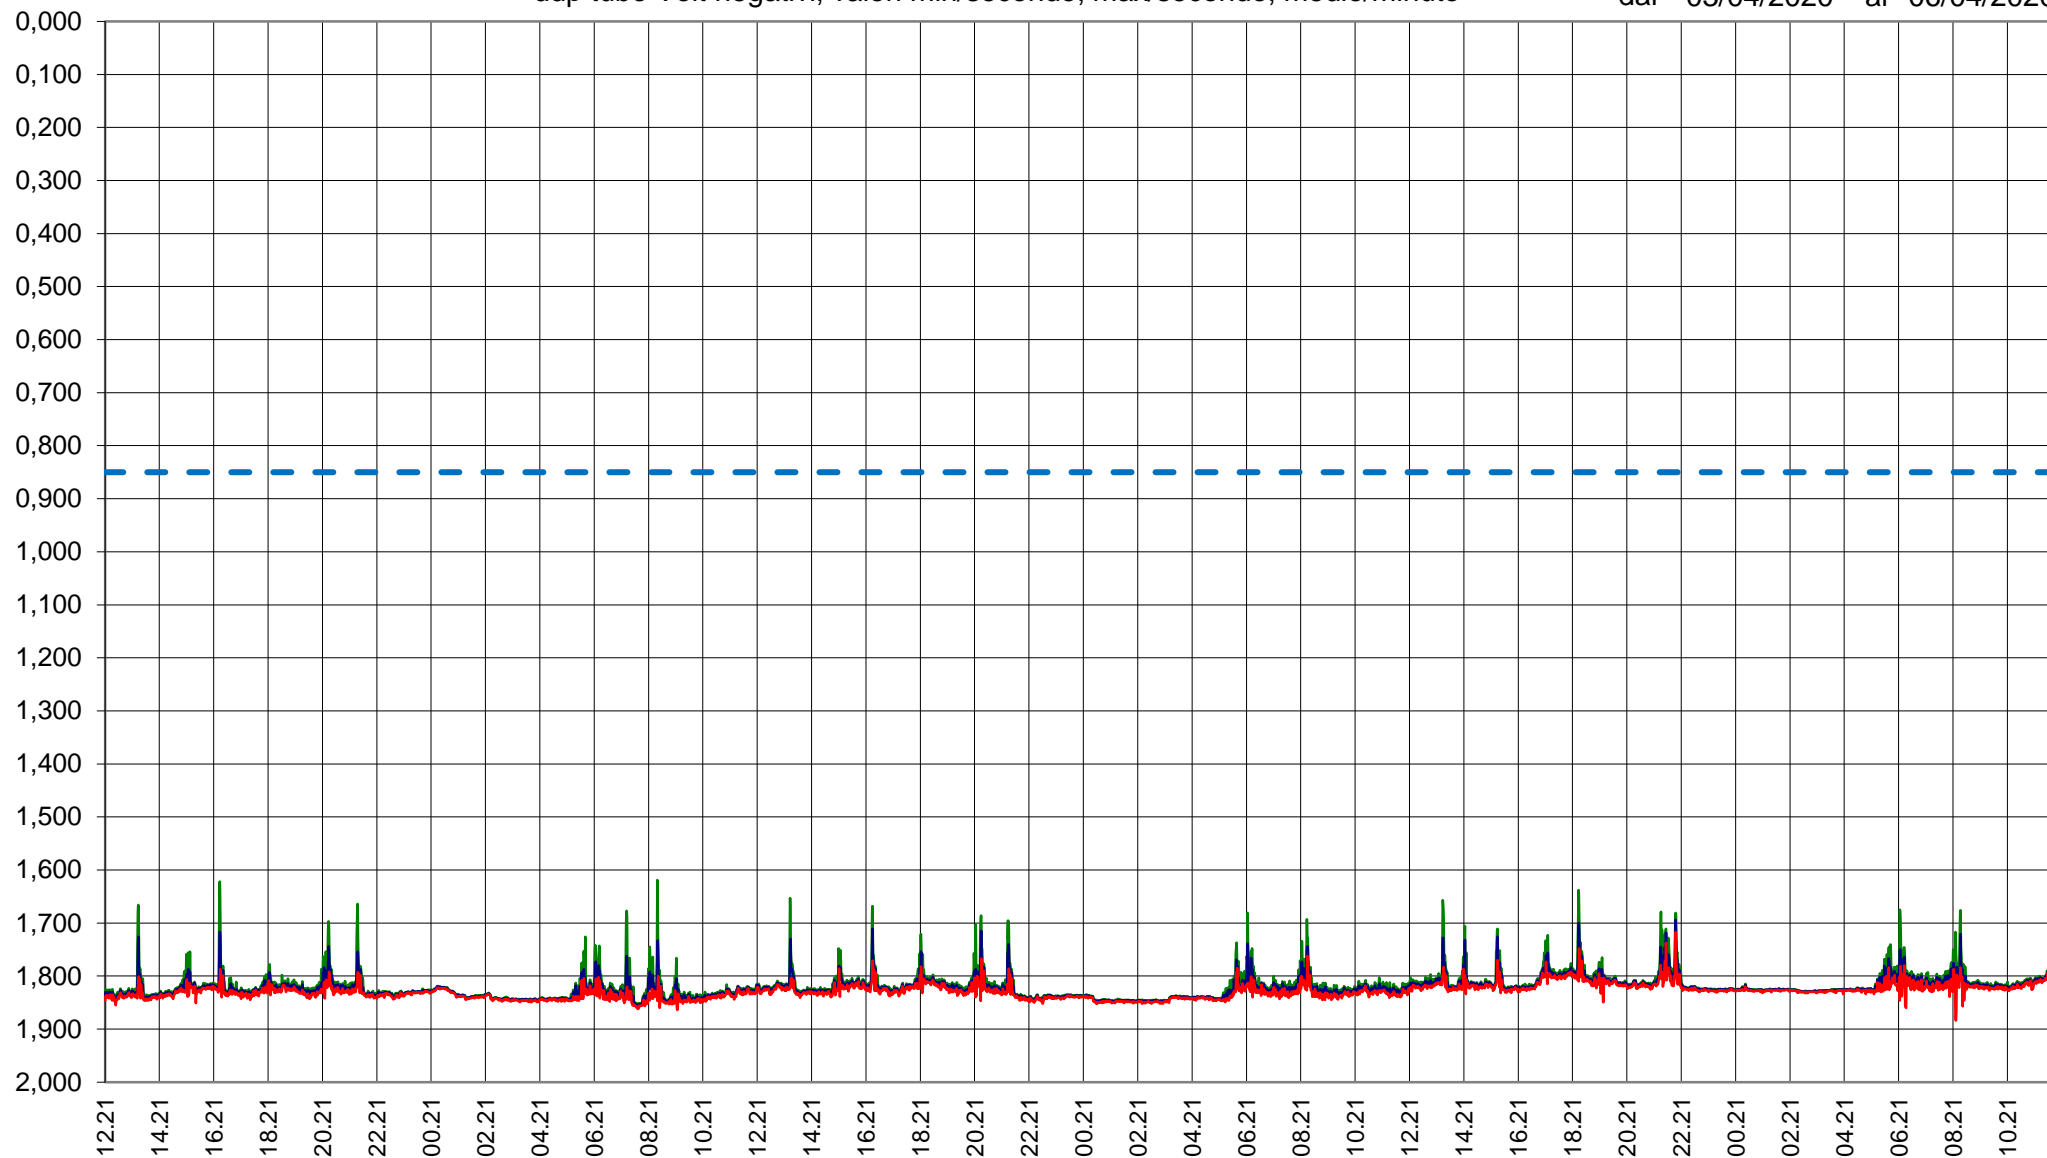

RTU1151 - AF13 - Montalto Dora - Via Aosta Fs 2

dcp guaina Volt negativi, valori min/secondo, max/secondo, medio/minuto

dal 03/04/2020 al 06/04/2020

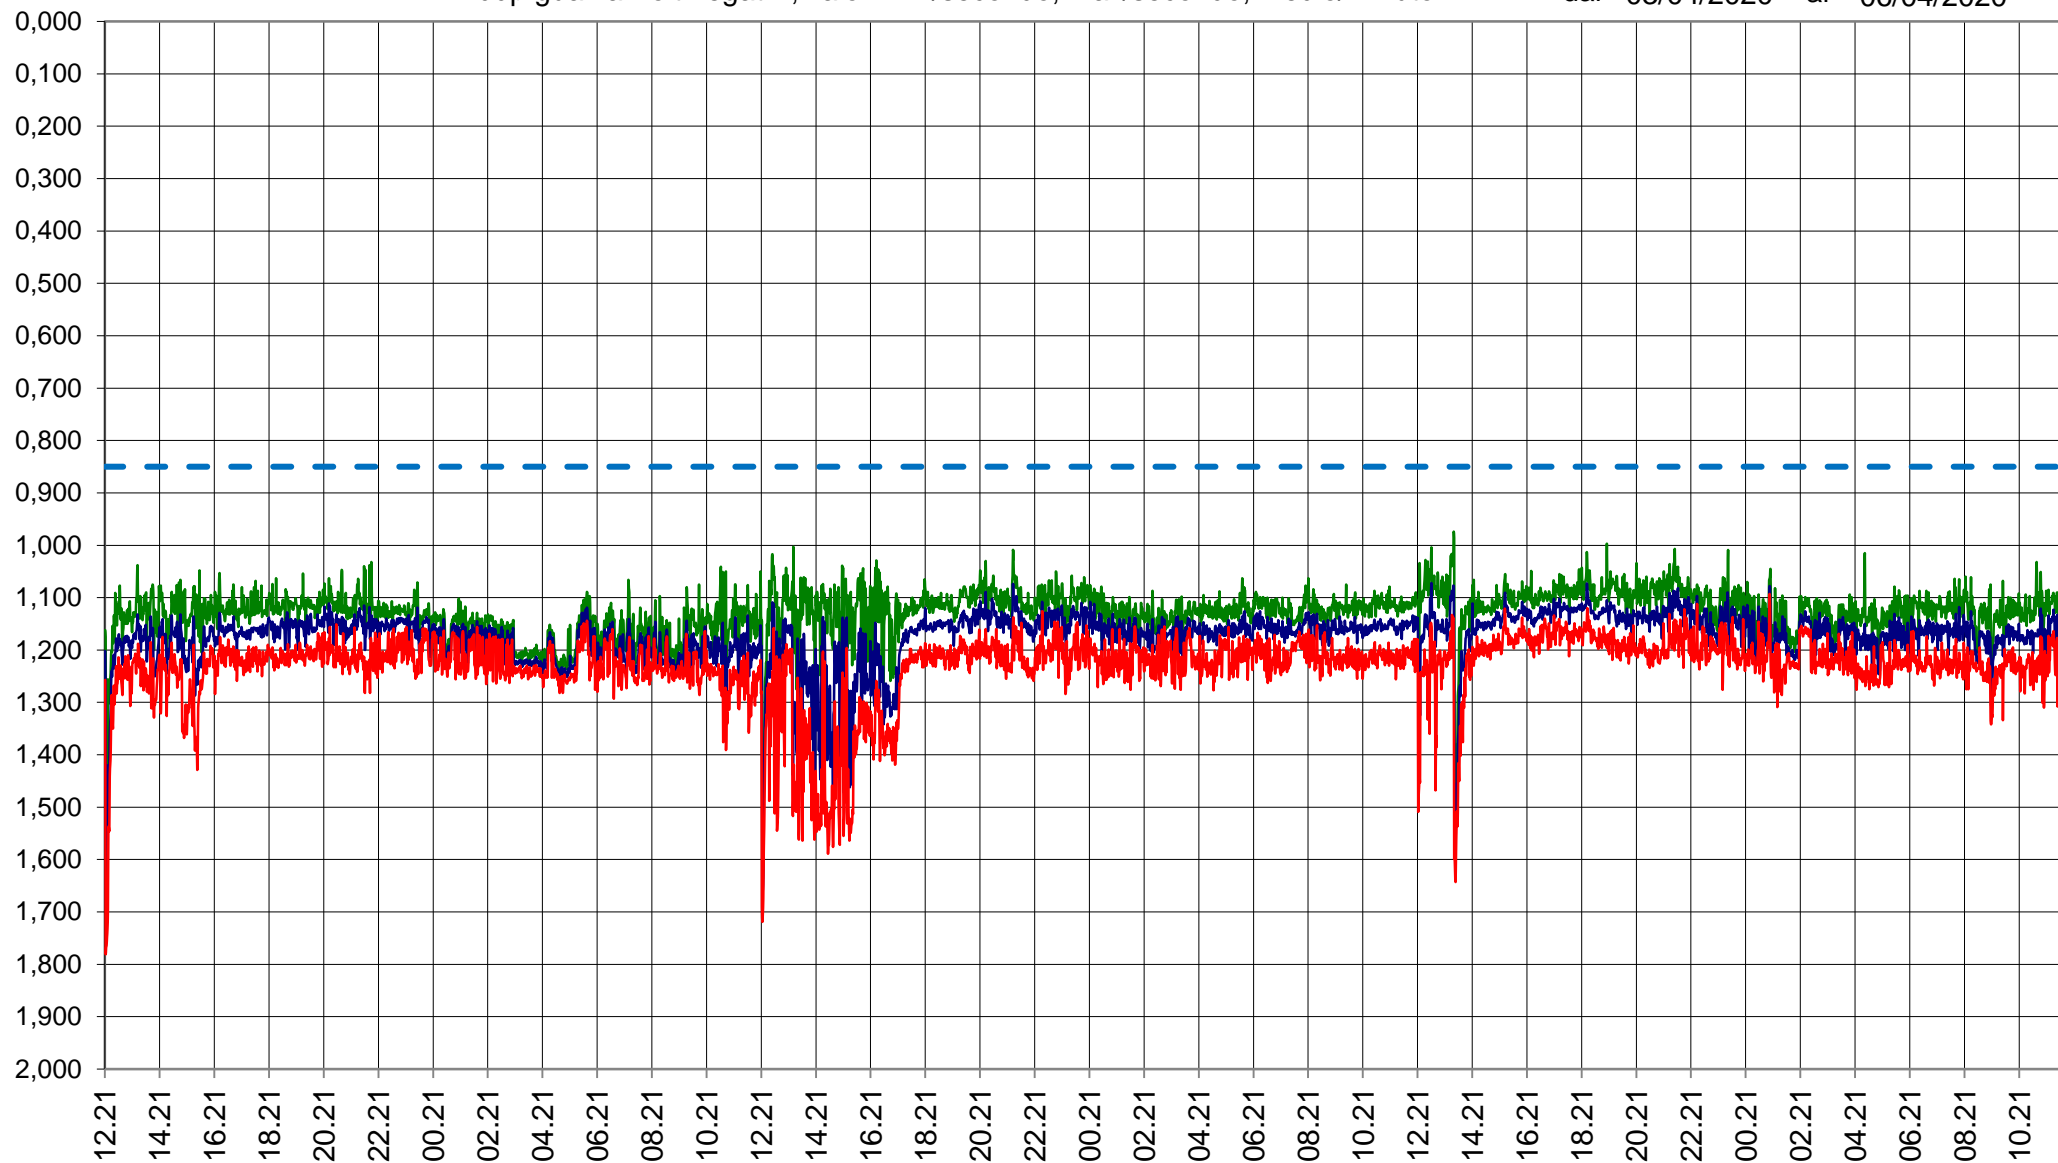



RETI DISTRIBUZIONE



RTU1151 - AF13 - Montalto Dora - Via Aosta Fs 2

ddp tubo e guaina Volt negativi, valori min/secondo, max/secondo, medio/minuto

dal 03/04/2020 al 06/04/2020

